



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi del
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

OGGETTO: Intervento urgente e indifferibile di ripristino e adeguamento di un guado del torrente Valnontey in località Valnontey in comune di Cogne, danneggiato dall'impeto delle acque torrentizie a seguito delle piogge del 28.08.2025.

Il giorno 28.08.2025, il sottoscritto tecnico della struttura interventi operativi – geom. Furio SARAVALLE – ha effettuato, a seguito della segnalazione pervenuta da parte del Sig. Franco ALLERA, Sindaco del comune di Cogne – un sopralluogo presso un guado del torrente Valnontey, in loc. Valnontey, nel comune di Cogne, danneggiato dall'impeto delle acque torrentizie seguenti le forti piogge del 28.08.2025.

Si è constatata l'ostruzione quasi totale delle tubazioni costituenti il detto guado, poiché le forti piogge dal carattere temporalesco manifestatesi la mattina del 28.08.2025 nella vallata di Valnontey, hanno provocato l'aumento

considerevole della portata liquida del torrente Valnontey in prossimità del guado sottostante l'abitato principale della vallata e ne è, pertanto, conseguito un forte danneggiamento dell'attraversamento in questione.

Il guado realizzato in somma urgenza a seguito dell'evento alluvionale datato 29 e 30 giugno 2024, creato con carattere di provvisorietà per permettere l'accesso di automezzi pesanti, mezzi agricoli ed altri, sulla sponda sinistra orografica della vallata di Valnontey, risulta essere ancor oggi l'unica via di transito possibile.

Il manufatto realizzato lo scorso anno, è stato eseguito con mezzi "di fortuna" dell'epoca, costituito da n. 8 tubazioni d'acciaio di grande diametro (circa 1000 mm) di proprietà della Ditta esecutrice delle opere, ricoperto superficialmente da materiale inerte da fiume.


Come facilmente immaginabile all'epoca, il guado realizzato poteva assolvere al suo compito in situazioni di magra del torrente, mentre già in situazioni di morbida del corso d'acqua, si temeva per la sua tenuta, come poi rivelatosi.

Considerato che a breve non verranno realizzate opere alternative e definitive all'attraversamento in questione, si rende necessario il ripristino ed il potenziamento del guado stesso mediante la posa di ulteriori quattro tubazioni di grande diametro da affiancare alle esistenti, ricoperte sulla sommità da materiale inerte da fiume presente in loco.

La regolarizzazione dell'alveo conseguente i lavori sopracitati implica un leggero disalveo del torrente a monte dell'attraversamento in esame, con trasporto del materiale di risulta in località Prasupiaz, sulla sponda destra

corografia della zona di intervento:

GUADO ALVEO TORR. VALNONTHEY
CON TUBI D'ACCIAIO
REALIZZATO A SEGUITO
ALLUVIONE GIUGNO 2024

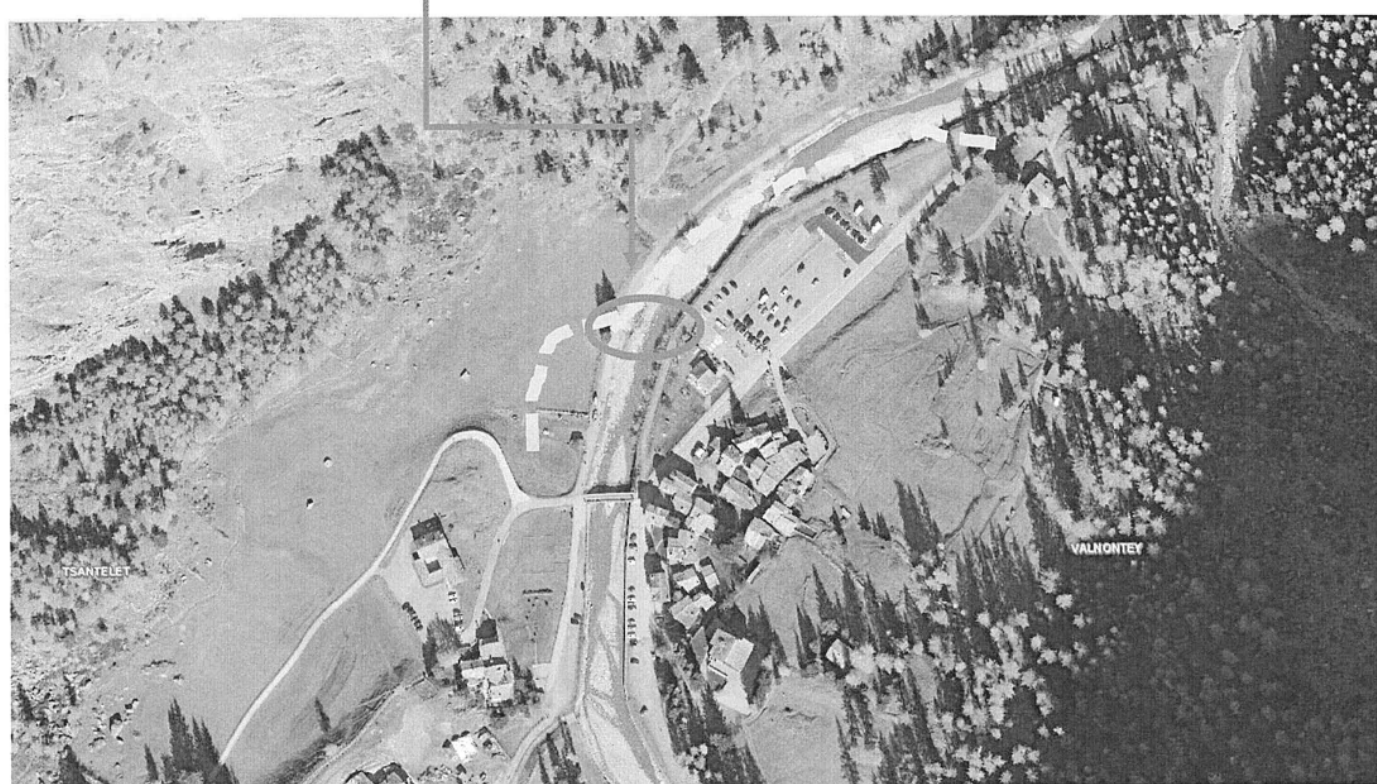

BC\
R:\LAVORI\AAA_SOMME URGENZE\AAA_SOMME URGENZE_2025\20250828_COgne_T.Valnontey_Ripristino guado_DAYNE_BC\02-ANAC\XXXverbaleSU.docx

orografia del torrente Valnontey, posto immediatamente a valle dell'Azienda agricola Prasupiaz.

Per quanto sopracitato, nell'intento di evitare possibili ulteriori danni all'attraversamento in alveo del torrente Valnontey in caso di aumento improvviso del flusso idraulico, si è ritenuto di provvedere all'esecuzione dei lavori urgenti sottoelencati, definiti di concerto con l'ing. Carlo BARTOLINI della Struttura interventi operativi, in qualità di RUP e con il dirigente dott. geol. Massimo BROCCOLATO:

- Deviazione temporanea dell'attuale flusso idraulico in sponda destra orografica;
- Posa a secco di nuove tubazioni di grande diametro affiancate alle precedenti;
- Manutenzione delle tubazioni esistenti e del piano viabile su loro estradosso;
- Regularizzazione dell'alveo in relazione alla nuova situazione idraulica mediante disalveo del torrente e trasporto a discarica del materiale inerte di risulta.

Il Capo Servizio di zona dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso Sig. CRISTOFORI Roberto, informato dal sottoscritto per le vie brevi circa i lavori necessari che rivestono carattere d'urgenza, non ha sollevato obiezione alcuna.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dott. geol. Massimo BROCCOLATO – dirigente della Struttura Interventi Operativi – delle seguenti nomine interne:

- ing. Carlo BARTOLINI: Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 15 e responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- geom. Furio SARAVALLE: Direttore dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 114.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1,

secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal Direttore dei Lavori e, sentito il Dirigente della Struttura Interventi Operativi, avvalendosi della seguente Ditta specializzata nell'ambito di tali tipologie di lavori, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resasi immediatamente disponibile:

- DAYNÉ STEFANO, con sede in Loc. Epinel, 109/A - 11012 Cogne (P.IVA: 01095370076).

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 727 del 16.06.2025 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.

la direzione lavori ha stimato che la spesa per detti lavori ammonta ad € 7.000,00.

Il sig. Stefano DAYNÉ, legale rappresentante della Ditta DAYNÉ STEFANO, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di accettare senza sollevare riserve

od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il presente verbale è redatto in unico originale.

Quart, li 29.08.2025

IL R.U.P.
- ing. Carlo BARTOLINI -

IL DIRETTORE DEI LAVORI
- geom. Furio SARAVALLE -

per accettazione:
LA DITTA DAYNÉ STEFANO
- Stefano DAYNÉ -

Visto, si approva:
IL DIRIGENTE
- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -
