



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e degli artt. 9, comma 4 e 18, comma 1 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di consolidamento del pendio ricompreso tra le viabilità comunale e regionale con interessamento della muratura di sottoscarpa relativa alla viabilità comunale, in comune di Lillianes, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto n. 168 del 17/04/2025 di dichiarazione di stato di calamità (I.D. portale diddesti n 4375 – cod intervento 111B_42_IO_ALL25).

Richiamato il Decreto n. 168 in data 17/04/2025 del Presidente della Regione di dichiarazione, sull'intero territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, l'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di aprile (23/04/2025), io sottoscritto geom. Alessandro PLATER, tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza

della Regione, ho redatto il presente verbale al fine di attivare un intervento urgente ed indifferibile di consolidamento del pendio ricompreso tra le viabilità comunale e regionale con interessamento della muratura di sottoscarpa relativa alla viabilità comunale, in comune di Lillianes, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto n. 168 del 17/04/2025 di dichiarazione di stato di calamità (I.D. portale diddesti n. 4523 e 4370).

Dato atto che a causa delle abbondanti precipitazioni prodottesi e del generale stato di saturazione dei terreni e della fusione nivale (vedasi bollettini di allerta meteorologica, idrogeologica e valanghiva nn. 105/2025, 106/2025, 107/2025 e 108/2025 dei giorni 15, 16, 17, e 18/04/2025), si sono verificate molteplici situazioni di criticità idrogeologica che hanno determinato numerosi dissesti sul territorio regionale.


In data 17 aprile 2025, dopo la segnalazione del Sindaco di Lillianes circa la presenza di una colata detritica con conseguente sversamento di materiale nei pressi di una abitazione in località Vers-Chessun in comune di Lillianes alla progressiva chilometrica 6 lungo la S.R. 44, l'agente forestale di turno Favre effettuava un sopralluogo e successivamente compilava la scheda sulla piattaforma Presidi (censito con ID 4375). Sentito il Dirigente della Struttura interventi operativi, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, attorno alle ore 10 a.m. del giorno 24 aprile 2025 ho effettuato un sopralluogo in loco, alla presenza dello stesso Dirigente e il Sindaco pro tempore di Lillianes, per verificare l'entità dello stesso.

Nel corso delle verifiche sono state individuate situazioni riconducibili a cedimenti strutturali delle murature/cordoli di sottoscarpa originatesi dalla viabilità comunale posta a monte di quella regionale, dovuti alle abbondanti ed eccezionali precipitazioni della giornata del 17 aprile 2025 che hanno provocato il franamento del pendio ricompreso fra le due viabilità.

Un intervento immediato sull'area in oggetto, consiste principalmente nelle seguenti attività:

- Posa new-jersey di delimitazione area di cantiere sulla viabilità e barriera provvisoria a valle, al piede del pendio in direzione della viabilità regionale;
- Ripristino strutturale delle murature di sottoscarpa stradale sulla viabilità comunale tramite rinforzo con palificata e trave sommitale di testata;
- Ripristino sicurvia;
- Sistemazione del pendio sottostante ricompreso fra le due viabilità tramite digaggio leggero e posa rete corticale armata;

Per una migliore illustrazione delle criticità allego in calce al presente verbale una documentazione fotografica e, per l'individuazione dei settori di intervento, con riferimento alla cartografia di seguito riportata, estratta dal CTRN:

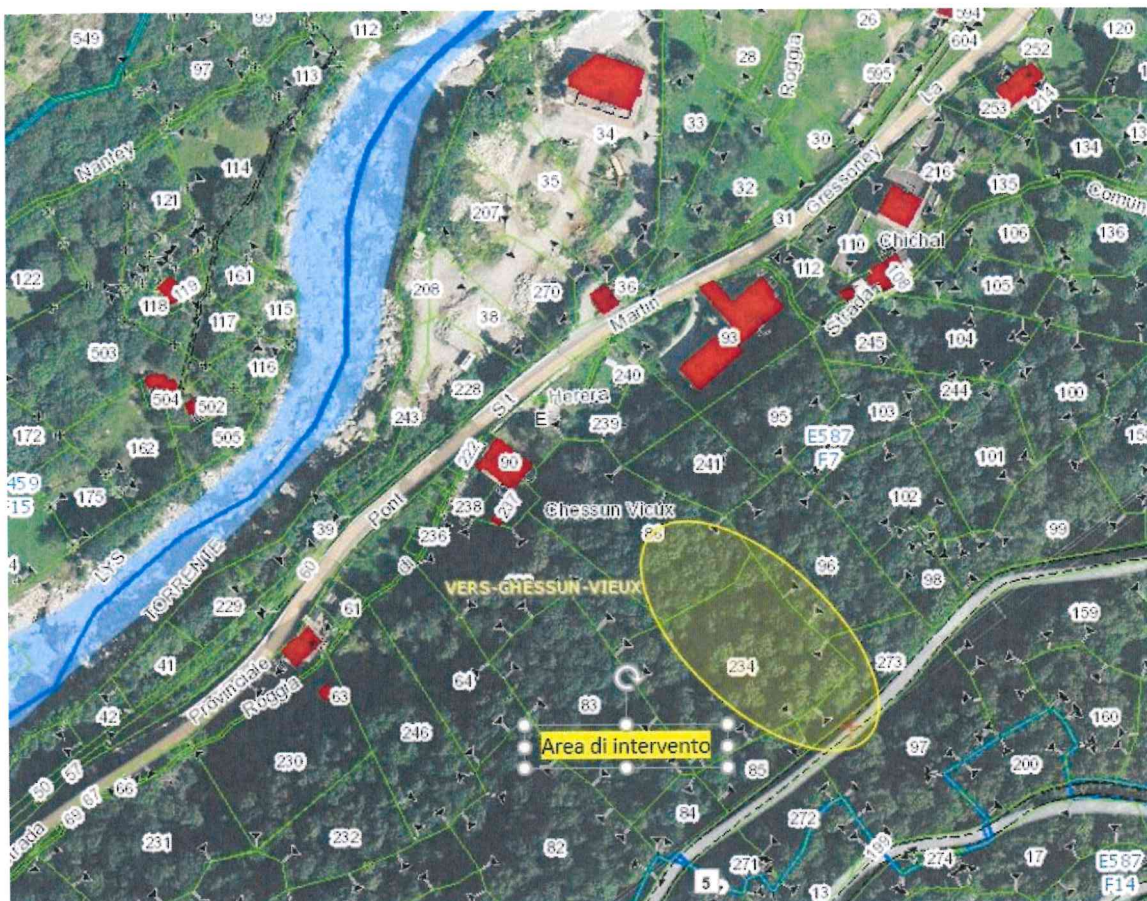

Le zone di intervento insistono su fondi distinti al catasto terreni del Comune di Lillianes al Foglio 7, mappali nn. 85-86-96-233-234-273.

Le rispettive coordinate UTM 32N-WGS 84 del sito di intervento sono le seguenti:

<i>X = EST</i>	<i>Y = NORD</i>
409373,89	5053216,25

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dalla direzione lavori, sentito il Dirigente della struttura interventi operativi, per mezzo dei sottoindicati operatori economici che

risultano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, resisi prontamente disponibili ad eseguire i lavori sopra elencati:

- PER I LAVORI:

- VACHER DONATELLA con sede in FRAZ. ESPAZ 53, FONTAINEMORE (Valle d'Aosta) - P. I.V.A.: 01149070078;
- ROCK VAL S.R.L.S., con sede in Via Alessandro Passerin d'Entreves 3, 11100 AOSTA (Valle d'Aosta) - P. I.V.A.: 01279720070;

- PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI:

- Ing. FIOU MARCO, con sede in loc. Pont Suaz 87 - 11020 Charvensod (P.IVA: 00589650076);

- PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA FASE ESECUTIVA:

- ing. Manuel LAVOYER, dello Studio omonimo, con sede in Pontey, fraz Banchet, 38 (P.IVA: 01097450074).

Per quanto attiene alla stima dei lavori si rimanda al computo metrico allegato del progettista ing. FIOU, redatto e i cui lavori saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente, aggiornato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024. Saranno compensati, laddove possibile, a misura, mentre saranno contabilizzate in economia le lavorazioni frammentarie e/o di difficoltosa quantificazione. L'importo netto dei lavori ammonta a €. 221.066,75 (€ 269.701,44 al lordo degli oneri I.V.A. al 22%)

- VACHER DONATELLA € 39.150,92 + IVA
- ROCK VAL € 181.915,83 + IVA



Mi riservo, secondo le indicazioni del progettista ad avvenuto completamento dei lavori, di integrare il presente verbale con l'esatta quantificazione, a consuntivo, del costo del presente intervento.

La Signora VACHER Donatella ed il sig. ARENA Mauro, legali rappresentanti della Ditta incaricate dei lavori, dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione degli stessi e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale. I lavori inizieranno nel mese di maggio.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal Dirigente, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, che:

- l'ing. Jean-Elisée BLANC, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è nominato Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008;
- il geom. Alessandro PLATER, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.
- il dott. for. Marco BETTINELLI, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato dell'assistenza alla direzione lavori ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

In ragione di quanto sopra esposto, ho proceduto a dar corso all'immediata attivazione dei necessari interventi e, dichiarando che i lavori stessi rivestono il carattere di urgenza, ha redatto il presente verbale.

Quart, lì 29 aprile 2025

Il Relatore
- geom. Alessandro PLATER



Il R.U.P.
- dott. ing. Jean-Elisée BLANC -



Gli operatori economici:

 VACHER DONATELLA
Fraz. Espaz n° 53
GPZ Entrèves (Ao)
P.N.A. 01140070078
- sig. Donatella VACHER -
340.73.38.969 - 340.34.31.857
greenjob.ao@gmail.com - vacher.donatella@pec.it

ROCK VAL S.r.l.s
Via Passerin d'Entrèves, 3 - 11100 Aosta (AO)
ROCK VAL S.r.l.s
- sig. Marco Bettinelli -
PEC: rockval@pec.it • Cod. Univ: W7YVJK9
Tel: 335/8424332


Il COSE
- ing. Manuel LAVOYER -



Il PROGETTISTA/DL STRUTTURE
- ing. Marco FIOU -



Il Dirigente
- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -



Il tecnico:

I Direttore dei lavori
- geom. Alessandro PLATER



Il tecnico:

L'assistente alla direzione dei lavori
- Dott. For. Marco BETTINELLI -



Top 332 W45435
SEP 25 1964
FBI - NEW YORK
RECEIVED
SEP 25 1964
FBI - NEW YORK

REPERTORIO FOTOGRAFICO



FOTO 1: vista da monte del fenomeno franoso



FOTO 2: vista del cedimento strutturale stradale e dell'evento franoso



FOTO 3: vista dal drone dell'evento



FOTO 4: vista dalla strada del fenomeno franoso
