



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e degli artt. 9, comma 4 e 18, comma 1 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli dal versante a monte dell'abitato in località Champats, in comune di Brusson, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto n. 168 del 17/04/2025 di dichiarazione di stato di calamità (I.D. portale diddesti n. 4523 – cod. intervento cod. intervento 23B_12_IO_ALL25).

Richiamato il Decreto n. 168 in data 17/04/2025 del Presidente della Regione di dichiarazione, sull'intero territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, l'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di aprile (23/04/2025), io sottoscritto geom. Alessandro PLATER, tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza della Regione, ho redatto il presente verbale al fine di attivare un intervento

urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli dal versante a monte dell'abitato in località Champats del Comune di Brusson, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto n. 168 del 17/04/2025 di dichiarazione di stato di calamità.

Dato atto che a causa delle abbondanti precipitazioni prodottesi e del generale stato di saturazione dei terreni e della fusione nivale (vedasi bollettini di allerta meteorologica, idrogeologica e valanghiva nn. 105/2025, 106/2025, 107/2025 e 108/2025 dei giorni 15, 16, 17, e 18/04/2025), si sono verificate molteplici situazioni di criticità idrogeologica che hanno determinato numerosi dissesti sul territorio regionale.

In data 22 aprile 2025, a seguito della segnalazione all'Amministrazione Comunale di Brusson da parte di un passante con conseguente comunicazione alla Centrale Unica del Soccorso, alle ore 18:00 l'agente forestale Vicquery Valerio effettuava un sopralluogo e successivamente compilava la scheda sulla piattaforma Presidi (censito con ID 4523) richiedendo sopralluogo urgente da parte dei tecnici della struttura scrivente. Sentito il Dirigente della Struttura interventi operativi, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, a partire dalle ore 09:30 del giorno 23 aprile 2024 ho effettuato un sopralluogo, alla presenza degli agenti CFV, polizia locale e ufficio tecnico comunale, per verificare l'entità dello stesso con l'assistenza del collega Marco BETTINELLI tecnico di ruolo della Struttura interventi operativi del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Presidenza della Regione

Nel corso del sopralluogo sono stati individuati due massi ciclopici delle dimensioni di circa 15,00 mc e 5,00 mc che si sono staccati dalla nicchia posta circa 30 metri di dislivello a monte. Il masso di dimensioni maggiori, dopo aver colpito un canale irriguo dismesso ed averne distrutto gli argini si è arrestato

poco più a valle, mentre quello di dimensioni inferiori si è arrestato qualche metro più in basso esaurendo la sua corsa contro un albero.

Non si hanno informazioni attendibili sulla data esatta dell'evento, ma dall'analisi delle tracce sul pendio si presuppone che sia avvenuto nei giorni di forti precipitazioni immediatamente precedenti il suddetto sopralluogo.

Un intervento immediato sull'area in oggetto, consiste principalmente nelle seguenti attività:

- legatura dei due massi di grandi dimensioni per mezzo di funi d'acciaio ancorate agli alberi presenti a monte (diametro minimo 16 mm);
- posa in opera di una barriera provvisoria al piede del pendio;
- disaggio di eventuali altri massi pericolanti nell'area circostante;
- perforazione dei massi ciclopici e successivo brillamento tramite materiale pirotecnico, previa autorizzazione in via d'urgenza da parte della Questura competente;
- ripristino degli argini del canale irriguo dismesso, che assume importante funzione di dissipazione dell'energia mitigando le conseguenze di potenziali successivi eventi;
- taglio della vegetazione e sistemazione sommaria della parte bassa del pendio con creazione di un piccolo rilevato deflettore avente medesima funzione.

Per una migliore illustrazione delle criticità allego in calce al presente verbale una documentazione fotografica e, per l'individuazione del settore di intervento, con riferimento alla cartografia di seguito riportata, estratta dal CTRN:



La zona di intervento insiste su fondi distinti al catasto terreni del Comune di Brusson al Foglio 31, mappali nn. 200, 206, 207, 240.

Le coordinate UTM 32N-WGS 84 del sito di intervento sono le seguenti:

<i>X = EST</i>	<i>Y = NORD</i>
400537,96	5068511,95

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dalla direzione lavori, sentito il Dirigente della struttura interventi operativi, per mezzo del sottoindicato operatore economico che risulta in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, resosi prontamente disponibile ad eseguire i lavori sopra elencati:

- EVANCON S.R.L. con sede in FRAZIONE VILLE 191, CHALLAND SAINT VICTOR (Valle d'Aosta) - P. I.V.A.: 00188490072

Considerato quanto sopra, io sottoscritto tecnico dell'Amministrazione regionale, ho proceduto ad una valutazione sommaria dell'impegno economico che le opere da eseguire comportano. Specifico che i lavori sono stati stimati e saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente, aggiornato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024. Saranno compensati, laddove possibile, a misura, mentre saranno contabilizzate in economia le lavorazioni frammentarie e/o di difficoltosa quantificazione. L'importo netto dei lavori ammonta a € 24.565,50 (€ 29.969,91 al lordo degli oneri I.V.A. al 22%) come da computo metrico estimativo allegato.

Mi riservo, ad avvenuto completamento dei lavori, di integrare il presente verbale con l'esatta quantificazione, a consuntivo, del costo del presente intervento.

Il Signor Vuillermin Lorenzo Maurizio, legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione degli stessi e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale. I lavori inizieranno in data odierna.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal Dirigente, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, che:

- l'ing. Jean-Elisée BLANC, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è nominato Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Direttore operativo per le opere specialistiche e Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008;
- il geom. Alessandro PLATER, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.
- il dott. for. Marco BETTINELLI, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato dell'assistenza alla direzione lavori ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

In ragione di quanto sopra esposto, ho proceduto a dar corso all'immediata attivazione dei necessari interventi e, dichiarando che i lavori stessi rivestono il carattere di urgenza, ha redatto il presente verbale.

Quart, li 23 aprile 2025

Il Relatore
- geom. Alessandro PLATER



Il R.U.P.
dott. ing. Jean-Elisée BLANC -




L'operatore economico:

L'Impresa
- Evançon s.r.l. -
Società EVANÇON s.r.l.
Fraz. Ville, 191 - Tel. 0125.967406
11020 Challand-St-Victor (Aosta)
P.Iva 00188490072 - SDI: SUBM70N




Il Dirigente

- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -



Il tecnico:

I Direttore dei lavori
- geom. Alessandro PLATER



Il tecnico:

L'assistente alla direzione dei lavori
- Dott. for. Marco BETTINELLI -



REPERTORIO FOTOGRAFICO



FOTO 1: vista laterale del masso ciclopico di dimensioni maggiori

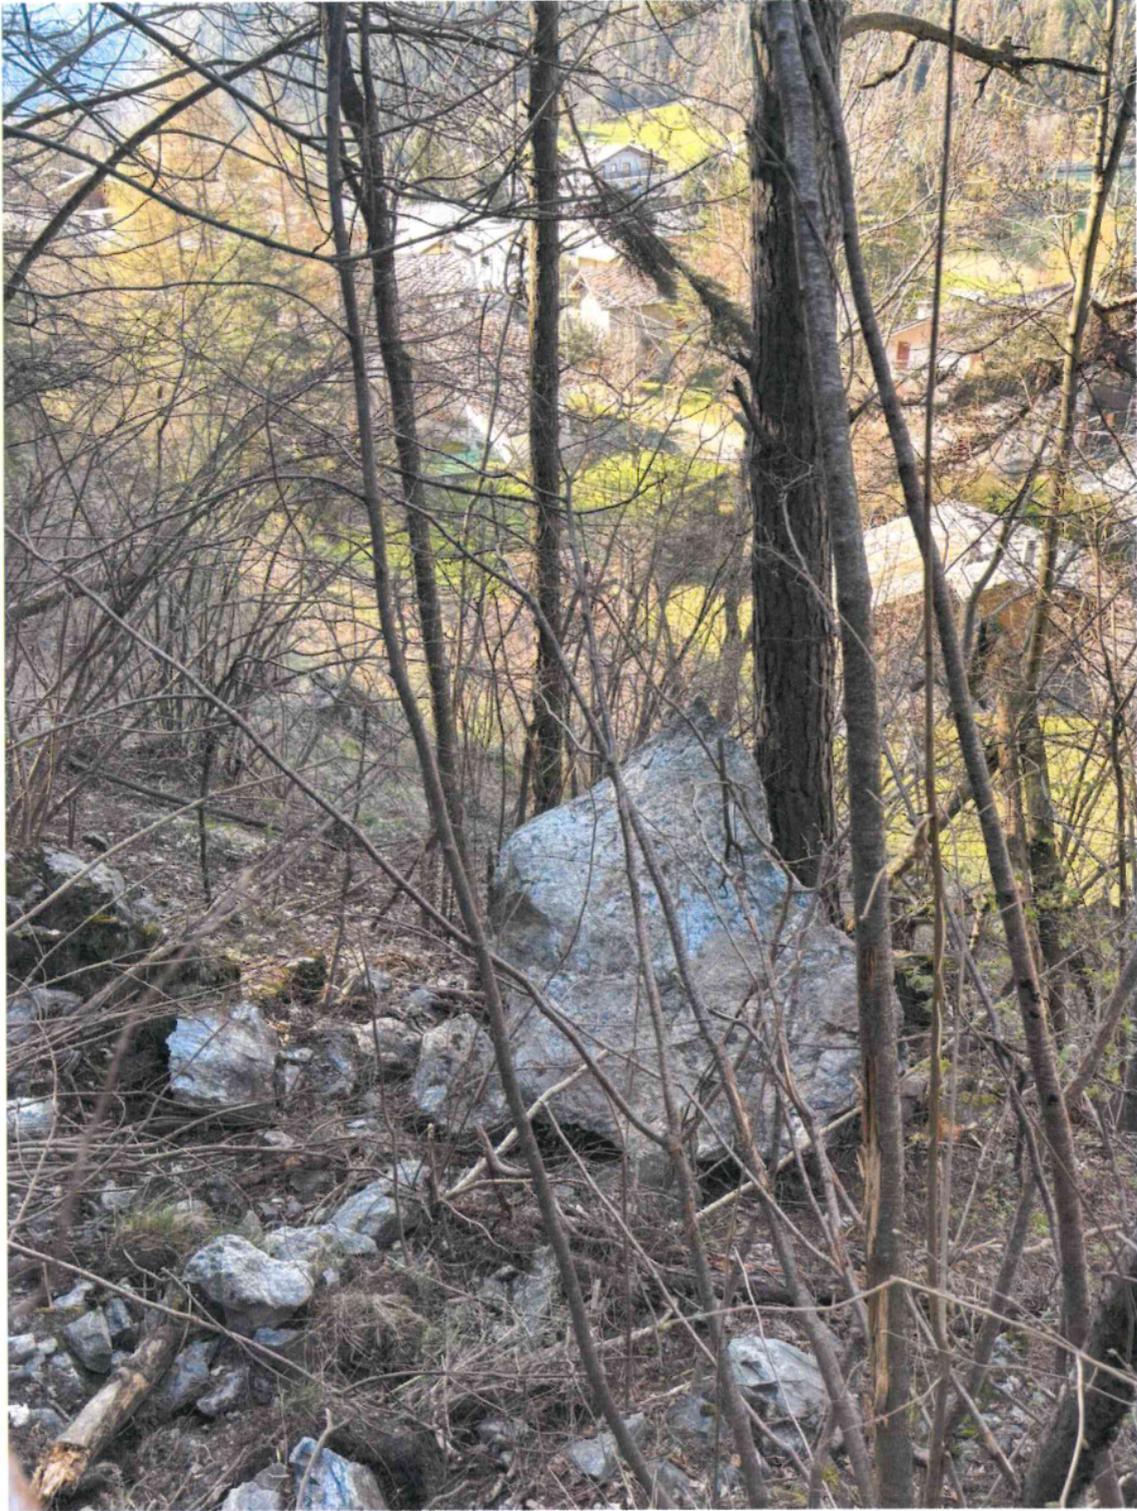


FOTO 2: vista da monte del masso ciclopico di dimensioni minori e dell'abitato sottostante



FOTO 3: vista della nicchia di distacco

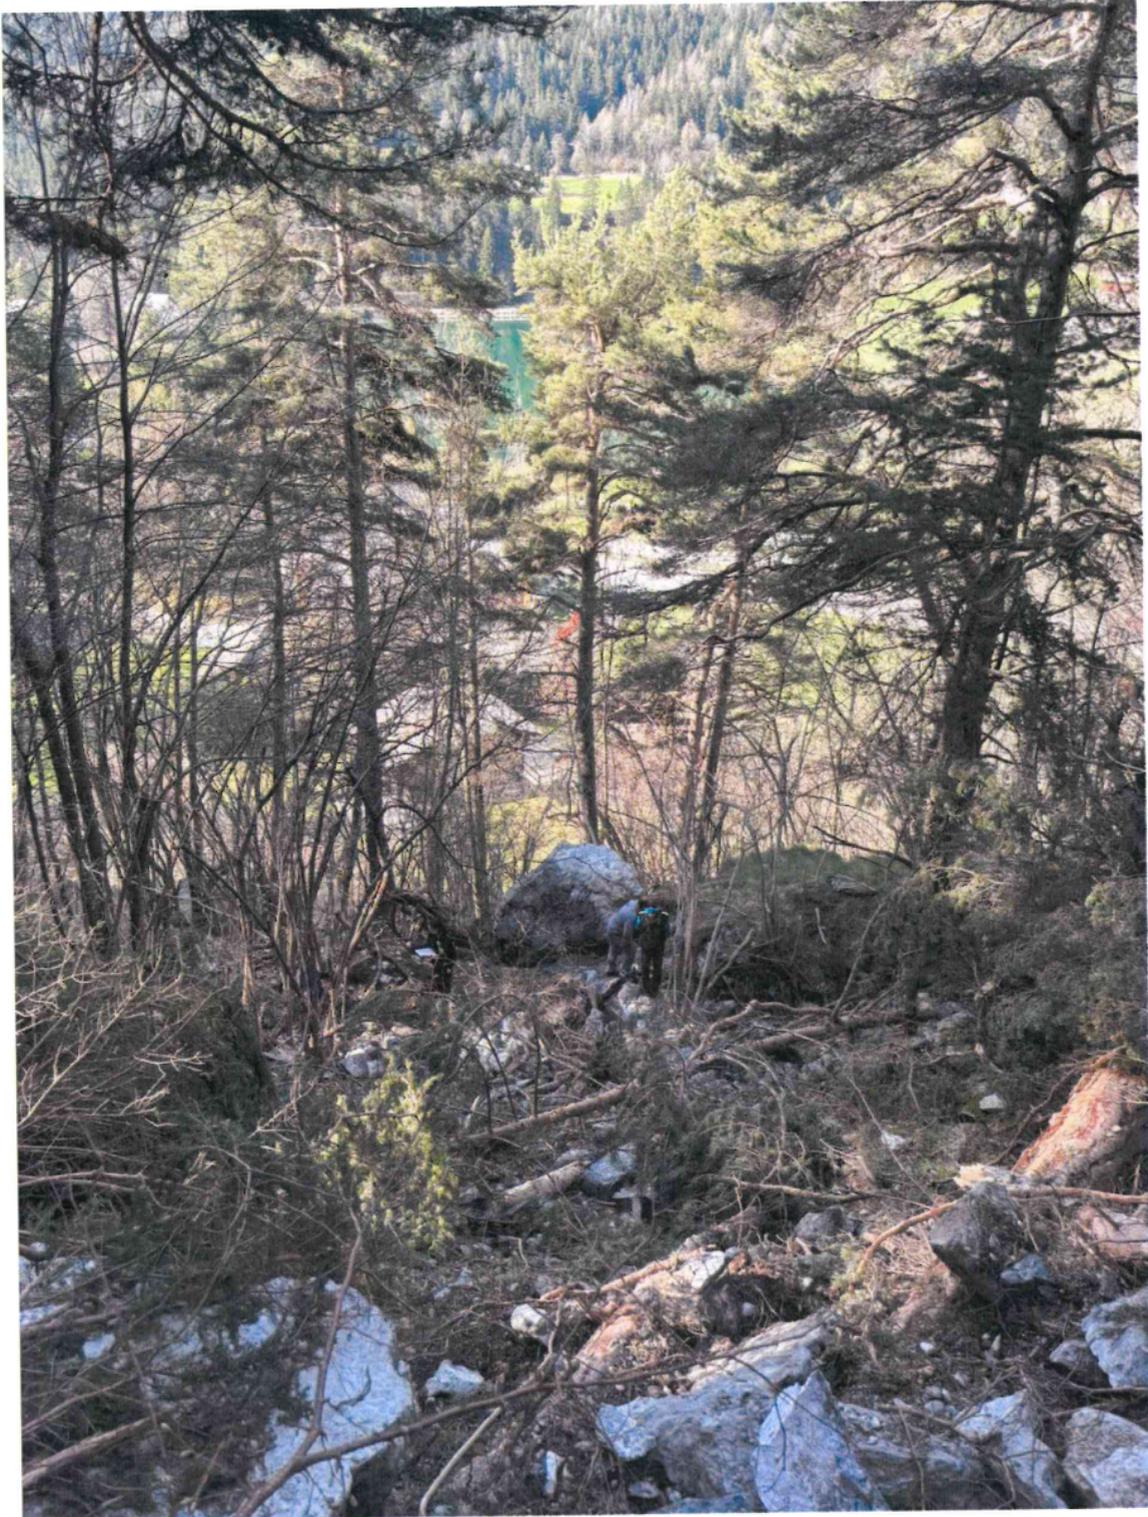


FOTO 4: vista dalla nicchia di distacco del masso ciclopico di maggiori dimensioni e dell'abitato sottostante
