



## **VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI**

(ai sensi del  
D.Lgs. 36/2023, art. 140 e della  
L.R. 5/2001, art. 9, comma 4 e art. 18, comma 1)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Pronto intervento di taglio vegetazione, disgaggio, posa di rivestimento corticale armato sul pendio a monte della viabilità regionale n. 45 alla progressiva chilometrica 2+400 nei pressi della loc. Chavascon in comune di Verrès, a seguito del crollo di massi lapidei verificatosi il giorno 22/09/2025 (I.D. Portale dissesti RAVA n. 4842).**

Il giorno 25.09.2025, il sottoscritto tecnico della Struttura Interventi Operativi geom. Alessandro PLATER, redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile volto alla mitigazione del rischio crolli mediante taglio vegetazione, disgaggio, posa di rivestimento corticale armato sul pendio a monte della viabilità regionale, interessato da rilascio di materiale lapideo.

Si è constatato che il tratto in questione si localizza lungo la S.R. n. 45 di Champoluc nei pressi della località Chavascon, alla progressiva chilometrica 2+400 dove, attorno alle ore 24:00 circa del giorno 22.09.2025, dal tratto di

pendio posto circa 80 mt di dislivello a monte della viabilità si è originato un distacco di blocchi lapidei di pezzatura decimetrica con interessamento della viabilità sottostante.


- Il sottoscritto tecnico della Struttura Interventi Operativi di P.C., dopo aver acquisito ulteriori informazioni sull'accaduto da parte degli agenti del CFV di Verrès presenti in loco per un'ispezione preliminare durante la notte, si recava sul tratto di viabilità segnalato attorno alle ore 7:30 del giorno successivo 23.09.2025 per verificare lo stato di attività del dissesto, sulla base del quale valutare la tipologia degli interventi necessari;
- in esito al sopralluogo, alla presenza degli agenti di zona del CFV, il Sindaco del comune di Verrès e del tecnico comunale, constatava che sulla porzione di pendio piuttosto acclive all'interno della fascia boscata che sovrasta la viabilità regionale per circa 80 mt di dislivello, si è generato un crollo lapideo che ha riversato sul pendio sottostante e parzialmente sulla viabilità regionale, alcuni blocchi di dimensioni comprese fra il 0,2 e 0,3 mc.
- effettuando un sopralluogo a piedi nei pressi della nicchia di distacco e di seguito anche con l'ausilio del drone, è stato possibile confermare l'origine dello stesso subito a valle del primo cambio di pendenza del versante a monte della viabilità, a causa della presenza di molta vegetazione arbustiva (roverella) che prosperando fra le spaccature della roccia ne provoca la progressiva fratturazione e conseguente collasso; a seguito dell'evento una parte dei blocchi si è arrestata lungo il pendio mentre alcune altre porzioni unitarie hanno invece raggiunto la viabilità regionale sottostante, senza fortunatamente arrecare danni a veicoli e/o individui in transito su di essa.

A seguito di quanto suesposto, stante il quadro di dissesto sopra delineato, considerato che potrebbero generarsi simili fenomeni di crollo dal

pendio e pareti rocciose anzidette e che lungo lo stesso sono ancora presenti porzioni non stabilizzate mobilizzatesi durante l'evento, si è ritenuto di dar corso all'immediata attivazione di un intervento urgente ed indifferibile articolato nelle seguenti lavorazioni:

- posa di una barriera provvisoria sulla viabilità, realizzata con new jersey e rete a doppia torsione, atta a mitigare eventuali ulteriori modesti rilasci post evento e a protezione della viabilità durante i lavori;
- taglio piante sul coronamento della nicchia di distacco con disaggio delle porzioni lapidee instabili e sgombero viabilità;
- taglio piante sul pendio a valle delle pareti rocciose con pulizia della vegetazione arbustiva nella parte bassa, atta all'individuazione dell'esatta metratura delle opere attive necessarie;
- posa di rete armata a doppia torsione e alcune porzioni di pannelli in fune/rete armata in corrispondenza di alcuni tratti di roccia di più grandi dimensioni (sul lato destro orografico della nicchia di distacco).

Per una migliore illustrazione della criticità si allega in calce al presente verbale una documentazione fotografica e, per l'individuazione del settore di intervento, con riferimento alla cartografia di seguito riportata, estratta dalla CTRN:

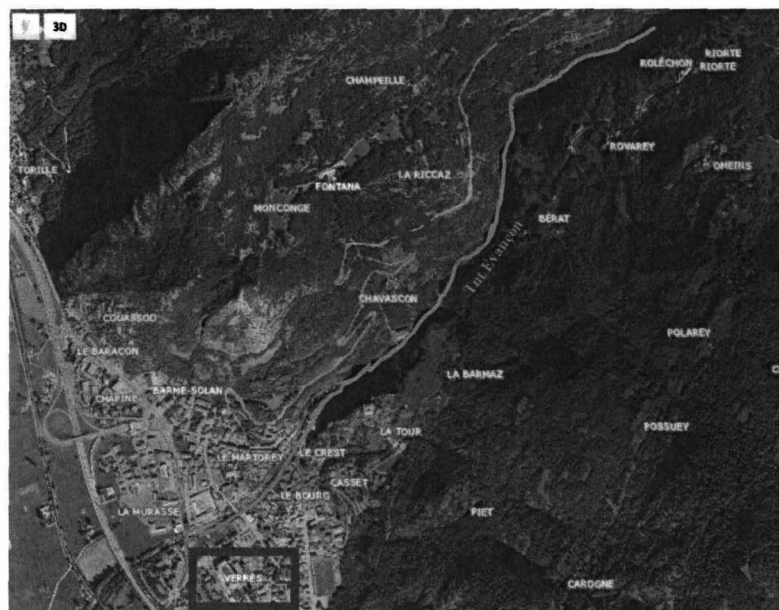

Si dà atto, in base a quanto disposto dal dott. geol. Massimo BROCCOLATO – dirigente della Struttura Interventi Operativi – delle seguenti nomine interne:

- ing. Carlo BARTOLINI: Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 15 e Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- geom. Alessandro PLATER: Direttore dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 114;
- dott. for. Marco BETTINELLI: assistenza alla Direzione Lavori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 114.

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi:

- del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), art. 40 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);
- della L.R. 5/2001 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), art. 9 (*Interventi urgenti e indifferibili*), comma 4 e art. 18 (*Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*), comma 1,

secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dal Direttore dei Lavori e, sentito il Dirigente della Struttura Interventi Operativi, avvalendosi dei seguenti Operatori Economici, specializzati nell'ambito di tali tipologie di lavori, in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari e resisi immediatamente disponibili:

- PER I LAVORI:

- I.R. & B. srl con sede in regione Glair - 11020 Arnad (P.IVA 00457630077);
- Dublanc Manuel s.n.c. con sede in Champdepraz, fraz. Les Sales (C.F: DBLMNL88A16A326T – P.IVA: 01250020078);

- PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

- ing. Marco GASPARD, con sede in Loc. Quinçod, 210 - 11020 Challand-Saint-Anselme (C.F. GSPMRC84P10A326G – P.IVA: 01155880071).

I lavori realizzati verranno pagati in base al Prezzario vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 727 del 16.06.2025 e, in riferimento ad esso, a fine lavori, sarà redatta la contabilità degli stessi.

La Direzione Lavori provvederà alla redazione della stima sommaria delle opere da eseguire con successiva perizia estimativa di spesa.

Il sig. Fabio BERGER legale rappresentante della I.R. & B. s.r.l., il sig. Manuel DUBLANC legale rappresentante della ditta omonima dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e del servizio e di accettare, senza sollevare riserve od obiezione alcuna, la consegna dei lavori e del servizio, che avvengono contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il presente verbale è redatto in unico originale.

Quart, li 25.09.2025

IL R.U.P.  
- ing. Carlo BARTOLINI -



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
- geom. Alessandro PLATER -

L'ASSISTENTE ALLA D.L.  
- dott. For. Marco BETTINELLI -

per accettazione:  
IMPRESA I.R. & B. s.r.l.  
- sig. Fabio BERGER -  
I.R. & B. s.r.l.  
Reg. Air  
(1020 ARNAD Aosta)  
C.F./P.I. 00457630077

per accettazione:  
IMPRESA DUBLANC Manuel s.n.c.  
- sig. Manuel DUBLANC -

per accettazione:  
IL CSP/CSE  
– ing. Marco GASPARD –

Visto, si approva:

IL DIRIGENTE  
– dott. geol. Massimo BROCCOLATO –

BC\

R:\LAVORI\AAA\_SOMME URGENZE\AAA\_SOMME URGENZE\_2025\20250922\_VERRES\_Crollo\_(SR45\_2+400)\_IR&B\_DUBLANC\02-ANAC\verbaleSU.docx

## **REPERTORIO FOTOGRAFICO**









