

Prot. n°: 7514/102 N
Data: 23/07/2025

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art.140 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.)


“Intervento di ripristino funzionale della viabilità consorziale di accesso ai nuclei agricoli di Pien e Ussert, interrotta dall’evento calamitoso dell’aprile 2025, nel Comune di Pontey”

Richiamata la dichiarazione dello stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta il 16 – 17 aprile 2025, adottata con decreto n. 168 del 17.04.2025;

su richiesta/segnalazione del CMF Pontey in merito al verificarsi di danni alle strade poderali dovuti all’azione erosiva del ruscellamento di acque provenienti dai pendii;

con riferimento alla segnalazione della Stazione forestale di Châtillon, all’interno della procedura CUS – Report dissesti, che ha catalogato il fenomeno con ID 4503;


sulla base delle osservazioni riscontrate direttamente in sito durante le attività di sopralluogo effettuate dai tecnici della struttura Sistemazioni montane, da cui si sono evidenziate le due seguenti condizioni e criticità:

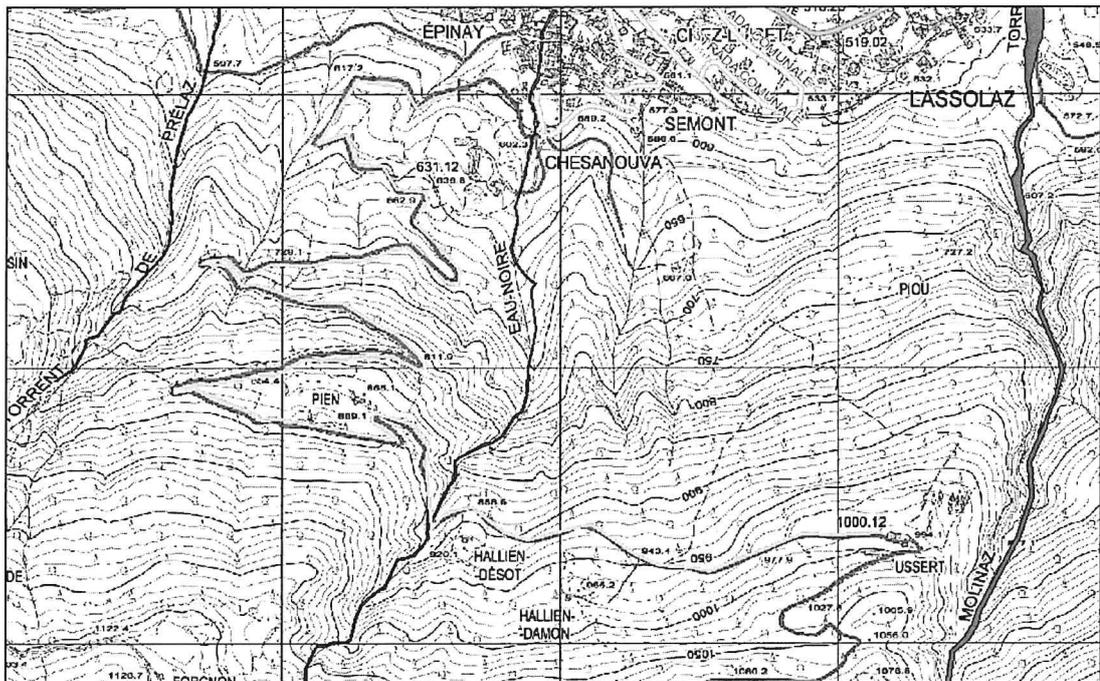

.....



- l'evento alluvionale di aprile ha attivato numerosi fenomeni di colate detritiche a carico degli impluvi compresi tra il bacino del Torrente Molinaz fino a quello di Prélaz;
- i suddetti fenomeni hanno saturato di materiale detritico i collettori in cls posti sul lato di monte della strada, all'imbocco delle tubazioni di attraversamento (tubi in cls – diametro 1000 mm) su un tratto di circa 4 km della strada interpodereale consortile Chesanouva-Pien-Ussert (in verde nell'immagine sopra riportata) tra le quote 600 m e 1000 m s.l.m.;
- l'intasamento della rete di scolo ha innescato dinamiche di ruscellamento superficiale e conseguente erosione del piano viabile con incisioni che raggiungono i 60 cm, interrompendone la percorribilità;
- l'attuale sistema di intercettazione e smaltimento delle acque meteoriche è costituito da canalette in terra di sezione ridotta e cunettoni trasversali in cls aventi inclinazione insufficiente a smaltire le portate in caso di eventi meteorologici intensi;
- la strada podereale rappresenta l'unico accesso per 4 alpeggi interessati dallo sfalcio e dal pascolo, oltre che alle vasche irrigue e alla condotta principale di alimentazione dell'intero comprensorio del consorzio;

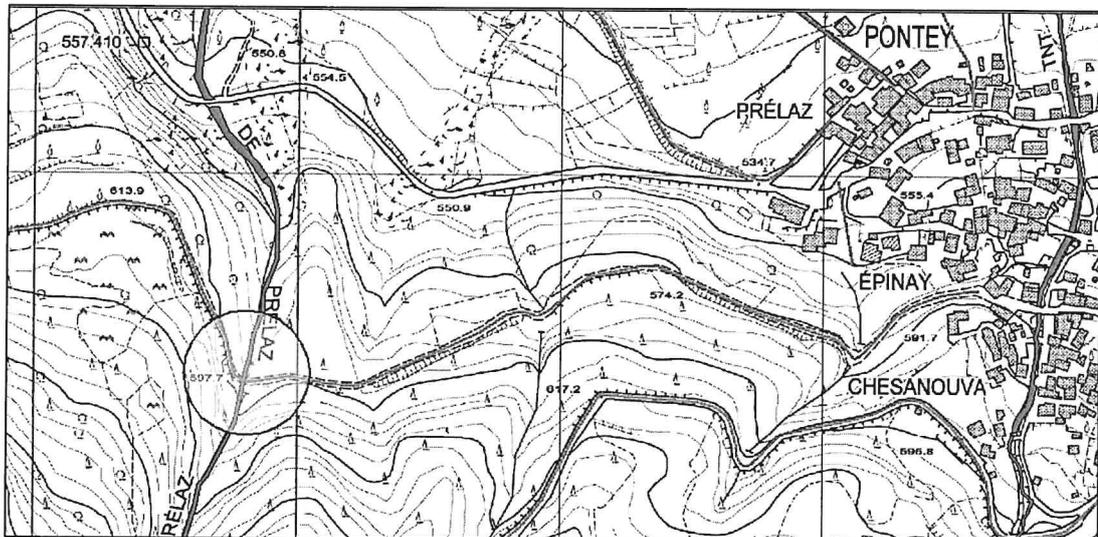

- più a valle, un secondo tratto di circa 900 m della strada podereale consortile Epiney-Roch è stato interessato dagli stessi fenomeni di ruscellamento ed erosione;
- una colata detritica ha coinvolto l'impluvio nel quale scorre il torrente Prélaz, sovralluvionando l'alveo in corrispondenza del guado in calcestruzzo di attraversamento e il guado stesso, nonché divelto la staccionata di valle;
- il guado è stato liberato in una prima fase emergenziale per permettere il transito verso i fondi interessati dallo sfalcio, ma l'accumulo detritico a monte e a valle del guado costituisce tuttora un ostacolo al normale deflusso delle portate del torrente in caso di precipitazioni intense;
- il tratto in esame è interessato anche dal percorso attrezzato denominato "Percorso salute".

La scrivente, Ing. Nicole Cerise, funzionario della struttura Sistemazioni montane dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, considerando l'urgenza di garantire l'accesso ai nuclei agricoli e ai manufatti irrigui, ritiene la sussistenza di gravi ed importanti motivi di rischio per la tutela di persone, beni ed attività antropiche tali da giustificare l'attivazione di un intervento di somma urgenza.



L'intervento dovrà essere finalizzato a:

- 1) Ripristino della viabilità consortile nel tratto Chesanouva – Pien – Ussert
 - Pulizia dei collettori a monte della strada e della rete di scolo delle acque superficiali;
 - adeguamento funzionale degli attraversamenti esistenti e realizzazione di ulteriori cunettoni in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque;
 - stabilizzazione del sedime stradale con materiale presente in loco, e dove necessario con apporto di misto stabilizzato di cava;

- 2) Nel tratto Epinay – Roch
 - pulizia della vasca di derivazione consortile;
 - pulizia del guado di attraversamento del torrente di Prélaz e disalveo del torrente per un tratto di circa 10 m a monte e a valle del guado;
 - rifacimento della staccionata nel tratto asportato dalla colata.

Ulteriori valutazioni operative verranno svolte a seguito delle prime verifiche ed interventi in sito.

La sottoscritta, Cerise Nicole, considerando l'urgenza temporale incompatibile con i tempi di affidamento previsti ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ritiene indispensabile ed indilazionabile intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando la ditta individuata dell'effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti.

I lavori in questione verranno quindi eseguiti ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ed affidati all'operatore economico Alpigen s.r.l. di Saint-Vincent – individuato in coordinamento con il dirigente e nel rispetto del principio di rotazione – con piena conoscenza dei luoghi e in possesso dei requisiti tecnico – professionali (qualificazione OG3) e delle attrezzature necessarie, che si è dichiarato disponibile ad attivarli immediatamente.

Si evidenzia l'urgenza di attivare l'intervento in tempi brevi al fine di ripristinare la funzionalità del collegamento stradale.

Sulla base dei riscontri sullo stato dei luoghi, in relazione alla tipologia e quantificazione delle lavorazioni sopradescritte, facendo sempre riferimento all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale vigente, si individua una stima economica iniziale, comprendente lavori a corpo, a misura ed in economia, costi della manodopera e oneri per la sicurezza, pari Euro 180.000,00 Lordi, da confermare contestualmente all'avanzamento dei lavori.

Si procederà alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori stessi.

La Ditta individuata procederà alla predisposizione del proprio POS, anche sulla base delle indicazioni per la sicurezza, con particolare riferimento alle interferenze, formulate dal DL.

Quart, li Luglio 2025

Il RUP

Ing. Nicole Cerise

(documento firmato digitalmente)



NICOLE

CERISE

21.07.2025

15:45:31

GMT+02:00

Visto il Dirigente

Dr. Massimo Pasqualotto

(documento firmato digitalmente)



MASSIMO
PASQUALOTTO
REGIONE
AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
DIRIGENTE
22.07.2025
11:56:50
GMT+02:00

