



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e degli artt. 9, comma 4 e 18, comma 1 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica del torrente La Pira del comune di Rhêmes-Notre-Dame, a seguito di due colate detritiche verificatesi il 23 e il 30 giugno 2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di luglio (08.07.2025), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica del torrente La Pira del comune di Rhêmes-Notre-Dame, a seguito di due colate detritiche verificatesi il 23 e il 30 giugno 2025

Si premette quanto segue:

- verso le ore 10:00 del 03.07.2025 il geom. Claudio Vicari, referente di zona per i fenomeni di dissesto idrogeologico della Struttura Interventi Operativi del Dipartimento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, veniva informato per via telefonica dal Sindaco pro-tempore del comune di Rhêmes-Notre-Dame circa due fenomeni di colata detritica verificatisi nell'arco di 7 giorni, a seguito di diverse intense precipitazioni temporalesche verificatesi nella fine del mese di giugno, lungo il torrente La Pira, che avevano determinato la formazione di vari depositi in alveo,


in particolare a monte dell'interferenza con la strada regionale n. 24, senza tuttavia interessare la carreggiata stradale;

- il geom. Claudio Vicari effettuava un sopralluogo in data 04.07.2025 a partire dalle ore 14:00, constatando la presenza di recenti accumuli detritici lungo l'alveo, in particolare in corrispondenza di alcuni gradoni e lungo le arginature in corrispondenza del sovrappasso stradale.

In ragione di quanto sopra esposto, considerato che il materiale detritico presente in alveo, riducendo sensibilmente la sezione idraulica e, di conseguenza, la capacità di deflusso del torrente, potrebbe generare, in occasione di intense ed improvvise precipitazioni tipiche della stagione in corso, ulteriori fenomeni di trasporto solido e di esondazione, con interessamento della strada regionale, si ritiene di dover dar corso all'immediata attivazione di un intervento di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica del torrente La Pira, consistente nelle seguenti lavorazioni:

- rimozione del materiale detritico presente in alveo;
- trasporto e sistemazione dello stesso materiale presso il sito di realizzazione dei valli paravalanghe in loc. Méignon del comune di Rhêmes-Saint-Georges;
- verifica e ripristino dei manufatti idraulici eventualmente danneggiati.

Per l'individuazione del settore di intervento, mi riferisco alla cartografia di seguito riportata, estratta dal CTRN:

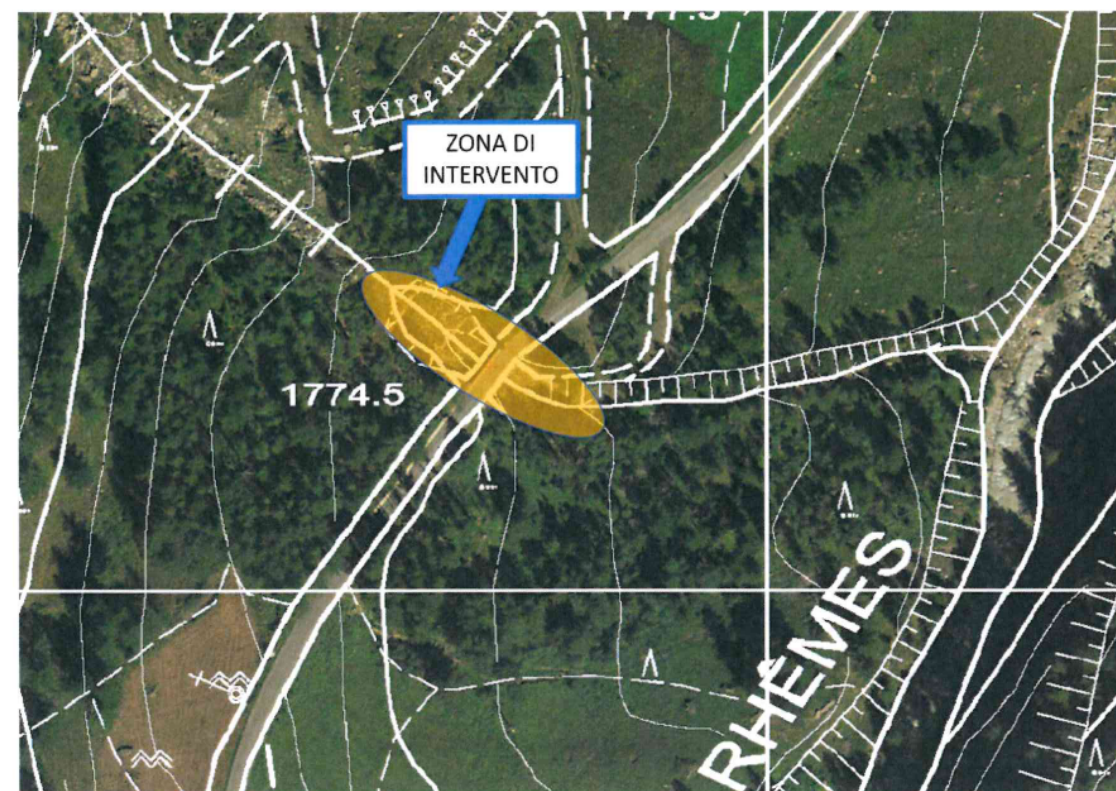

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dalla direzione lavori e, sentito il Dirigente della struttura interventi operativi, per mezzo del sottoindicato operatore economico, che risulta in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, resosi prontamente disponibile ad eseguire i lavori sopra elencati:

- impresa EDIL EURO 2000 S.R.L. con sede in Loc. Montbel n. 18, 11010 Aymavilles (Valle d'Aosta) - P. I.V.A.: 00662860071.

Vista la presenza di diverse imprese impegnate nello scarico e sistemazione del materiale presso il vallo di Méignon si ritiene necessario nominare un C.S.E. nella figura di:

- geom. Marco BERNARDI, libero professionista iscritto al collegio dei geometri della Valle d'Aosta al n. 1250, con studio tecnico in Villeneuve

Le operazioni di disalveo e movimento terra saranno effettuate, previa caratterizzazione ambientale di campioni del materiale detritico depositato dal torrente, ai sensi dell'art. 184-bis (sottoprodotto) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 39 c.13 del D.Lgs. 205/2010.

Considerato quanto sopra, io sottoscritto tecnico dell'Amministrazione regionale, ho proceduto ad una valutazione sommaria dell'impegno economico che le opere da eseguire comportano. Specifico che i lavori sono stati stimati e saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente, aggiornato con D.G.R. n. 727 in data 16 giugno 2025. Saranno compensati, laddove possibile, a misura, mentre saranno contabilizzate in economia le lavorazioni frammentarie e/o di difficoltosa quantificazione. L'importo netto dei lavori ammonta a € 29.599,94 I.V.A. esclusa, come da computo metrico estimativo allegato al presente verbale, con applicazione del ribasso previsto secondo le modalità previste dal *protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza*, approvato con provvedimento dirigenziale n. 103 in data 04.03.2025.

Mi riservo, ad avvenuto completamento dei lavori, di integrare il presente verbale con l'esatta quantificazione, a consuntivo, del costo del presente intervento.

Il Signor Mario LAZZARO, legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione degli stessi e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal Dirigente, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, che:


- l'ing. Jean-Elisée BLANC, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è nominato Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Direttore operativo per le opere specialistiche e Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008;
- il geom. Claudio VICARI, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023;
- il geom. Didier SAVIOZ, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato dell'assistenza alla direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

In ragione di quanto sopra esposto, ho proceduto a dar corso all'immediata attivazione dei necessari interventi e, dichiarando che i lavori stessi rivestono il carattere di urgenza, ha redatto il presente verbale.

Quart, li 05 luglio 2025

Il tecnico:

I Direttore dei lavori
- geom. Claudio VICARI -



Il Dirigente


- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -



L'operatore economico:

L'Impresa EDIL EURO 2000 S.R.L.

- sig. Mario LAZZARO -



Il R.U.P.

- dott. ing. Jean-Elisée BLANC -



Il tecnico:

Assistente Direttore dei lavori

- geom. Didier SAVIOZ -



IL C.S.E.

- geom. Marco BERNARDI -



REPERTORIO

FOTOGRAFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA									
OGGETTO DELL'INTERVENTO: Intervento urgente ed indifferibile di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica del torrente La Pira del comune di Rhêmes-Notre-Dame, a seguito di due colate detritiche verificatesi il 23 e il 30 giugno 2025.									
n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula		u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello							
		2 operai * 8 ore * 5 giorni			€/h	80,00	80,00	€ 43,46	€ 3.476,80
2	M00.A40.002	Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm - Operaio specializzato III livello							
		2 operai * 8 ore * 5 giorni			€/h	80,00	80,00	€ 2,58	€ 206,40
7	N00.A25.240	Nolo di autocarro mezzo d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolato, compreso autista e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo - autocarro P.T.T. oltre 18,0 t fino a 24,0 t							
		2 * 8 ore * 8 giorni (Trasporto materiale da disalveo)			€/h	128,00	128,00	€ 88,63	€ 11.344,64
8	N00.E52.060	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo - potenza oltre 30 kW fino a 42 kW peso operativo da 46 a 75 qli - tipo CAT 306							
		8 ore * 5 giorni (Disalveo)			€/h	40,00	40,00	€ 75,00	€ 3.000,00
8	N00.E53.180	Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo - potenza oltre 155 kW fino a 180 kW peso operativo da 281 a 315 qli - tipo CAT 330							
		8 ore * 8 giorni (Disalveo)			€/h	64,00	64,00	€ 145,97	€ 9.342,08
9	T01.D20.010	Fornitura e posa in opera di box bagno - Servizi igienici - noleggio 1° mese							
		nr 1			cad.	1,00	1,00	€ 249,88	€ 249,88
9	T01.D30.010	Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego							
		nr 1			cad.	1,00	1,00	€ 480,14	€ 480,14
10	SIC	Altri oneri della sicurezza							€ 1.500,00

	TOTALE LORDO	€ 29.599,94
--	--------------	-------------

	Oneri della sicurezza NON SOGGETTI a ribasso	€ 2.230,02
	Importo NON SOGGETTO a ribasso per affidamento in somma urgenza	€ 60.000,00

	Importo SOGGETTO a ribasso	€ -
--	----------------------------	-----

	Ribasso del 11,70%	€ -
--	--------------------	-----

	TOTALE NETTO	€ 29.599,94
--	--------------	-------------

Quart, li 05.07.2025

	IL TECNICO		L'IMPRESA
			
