



VERBALE DI ESECUZIONE D'URGENZA DI LAVORI INDIFFERIBILI

(ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e degli artt. 9, comma 4 e 18, comma 1 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5)

OGGETTO: Intervento urgente ed indifferibile di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica dei torrenti Chantéry e Ergioi del comune di Rhêmes-Notre-Dame, a seguito di due colate detritiche.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di luglio (14.07.2025), si redige il presente verbale finalizzato all'esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica dei torrenti Chantéry e Ergioi del comune di Rhêmes-Notre-Dame, a seguito di due colate detritiche.

Si premette quanto segue:

- verso le ore 10:00 del 11.07.2025 il geom. Claudio Vicari, referente di zona per i fenomeni di dissesto idrogeologico della Struttura Interventi Operativi del Dipartimento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, veniva informato per via telefonica dal Sindaco pro-tempore del comune di Rhêmes-Notre-Dame circa due fenomeni di colata detritica, verificatisi a seguito di diverse intense precipitazioni temporalesche, lungo i torrenti Chantéry e Ergioi, che avevano determinato la formazione di vari

depositi in alveo, in particolare a monte dell'interferenza con la strada regionale n. 24, senza tuttavia interessare la carreggiata stradale;

- il geom. Claudio Vicari effettuava un sopralluogo in data 14.07.2025 a partire dalle ore 08:00, constatando la presenza di recenti accumuli detritici lungo i due alvei, in particolare in corrispondenza di alcuni gradoni e lungo le arginature in corrispondenza del sovrappasso stradale.

In ragione di quanto sopra esposto, considerato che il materiale detritico presente nei due alvei, riducendo sensibilmente la sezione idraulica e, di conseguenza, la capacità di deflusso dei torrenti, potrebbe generare, in occasione di intense ed improvvise precipitazioni tipiche della stagione in corso, ulteriori fenomeni di trasporto solido e di esondazione, con interessamento della strada regionale, si ritiene di dover dar corso all'immediata attivazione di un intervento di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica dei torrenti Chantéry e Ergioi, consistente nelle seguenti lavorazioni:


- rimozione del materiale detritico presente in alveo;
- trasporto e sistemazione dello stesso materiale presso il sito di realizzazione dei valli paravalanghe in loc. Mélignon del comune di Rhêmes-Saint-Georges;
- verifica e ripristino dei manufatti idraulici eventualmente danneggiati.

Per l'individuazione del settore di intervento, mi riferisco alla cartografia di seguito riportata, estratta dal CTRN:

La zona di intervento del torrente Chantéry:



La zona di intervento del torrente Ergioi:

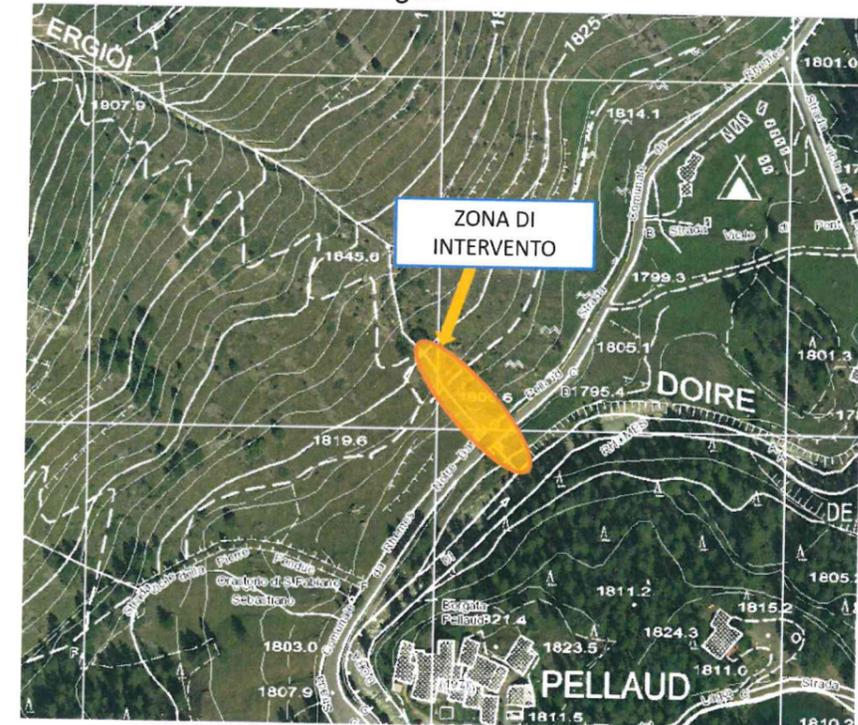

Gli interventi sopra descritti saranno eseguiti ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo le indicazioni e la tempistica stabilite dalla direzione lavori e, sentito il Dirigente della struttura interventi operativi, per mezzo dei sottoindicati operatori economici, che risultano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, resisi prontamente disponibili ad eseguire i lavori sopra elencati:

Per l'effettuazione dei lavori:

- impresa CAVE CHAVONNE S.R.L. con sede in Loc. Preille n. 28, 11010 Saint-Pierre (Valle d'Aosta) - P. I.V.A.: 00173760075, alla quale sono affidati i lavori di disalveo
- impresa CHACARD S.R.L. con sede in località Les Iles n. 9/D, 11020 Pollein (Valle d'Aosta) - P. I.V.A.: 01059440071, alla quale sono affidati i lavori di sistemazione del materiale detritico presso i valli di Méignon.

Per l'incarico di C.S.E.:

- il geom. Marco BERNARDI, libero professionista iscritto al collegio dei geometri della Valle d'Aosta al n. 1250, con studio tecnico in Villeneuve

Le operazioni di disalveo e movimento terra saranno effettuate, previa caratterizzazione ambientale di campioni del materiale detritico depositato dal torrente, ai sensi dell'art. 184-bis (sottoprodotto) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 39 c.13 del D.Lgs. 205/2010.

Considerato quanto sopra, io sottoscritto tecnico dell'Amministrazione regionale, ho proceduto ad una valutazione sommaria dell'impegno economico che le opere da eseguire comportano. Specifico che i lavori sono stati stimati e saranno contabilizzati facendo riferimento all'elenco prezzi regionale vigente, aggiornato con D.G.R. n. 727 in data 16 giugno 2025. Saranno compensati, laddove possibile, a misura, mentre saranno contabilizzate in economia le lavorazioni frammentarie e/o di difficoltosa quantificazione. L'importo netto dei

lavori ammonta a € 58.373,14 I.V.A. esclusa, come da computo metrico estimativo allegato al presente verbale, così suddiviso:

- lavori affidati all'impresa CAVE CHAVONNE S.R.L.: €
- lavori affidati all'impresa CHACARD S.R.L.: €

Qualora i suddetti importi, in corso d'opera, superassero la soglia di € 60.000,00 verrà applicato il ribasso previsto secondo le modalità previste dal *protocollo di intesa per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza*, approvato con provvedimento dirigenziale n. 103 in data 04.03.2025.

Mi riservo, ad avvenuto completamento dei lavori, di integrare il presente verbale con l'esatta quantificazione, a consuntivo, del costo del presente intervento.

Il Signor Rik CLUSAZ, legale rappresentante della Ditta CAVE CHAVONNE S.R.L., il sig. Shkelzen TERZIA, legale rappresentante della Ditta CHACARD S.R.L. e il geom. Marco BERNARDI dichiarano di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione degli stessi e di accettare senza sollevare riserve od obiezione alcuna la consegna dei lavori, che avviene contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto, in base a quanto disposto dal Dirigente, dott. geol. Massimo BROCCOLATO, che:

- l'ing. Jean-Elisée BLANC, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è nominato Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Direttore operativo per le opere specialistiche e Responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008;
- il geom. Claudio VICARI, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023;

- il geom. Didier SAVIOZ, dipendente di ruolo della Struttura Interventi operativi, è incaricato dell'assistenza alla direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

In ragione di quanto sopra esposto, ho proceduto a dar corso all'immediata attivazione dei necessari interventi e, dichiarando che i lavori stessi rivestono il carattere di urgenza, ha redatto il presente verbale.

Quart, lì 14 luglio 2025

Il tecnico:
Direttore dei lavori
- geom. Claudio VICARI -

Il Dirigente
- dott. geol. Massimo BROCCOLATO -

L'operatore economico:
L'Impresa CAVE CHAVONNE S.R.L.
- sig. Rik CLUSAZ -

IL C.S.E.
- geom. Marco BERNARDI -

Il R.U.P.
- dott. ing. Jean-Elisée BLANC -

Il tecnico:
Assistente Direttore dei lavori
- geom. Didier SAVIOZ -

L'operatore economico:
L'Impresa CHACARD S.R.L.
- sig. Shkelzen TERZIA -

REPERTORIO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Torrente Chantéry



FOTO 2: Torrente Chantéry



FOTO 3: Torrente Ergioi




FOTO 4: Torrente Ergioi

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Intervento urgente ed indifferibile di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica dei torrenti Chantéry e Ergioi del comune di Rhêmes-Notre-Dame, a seguito di due colate detritiche.

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello						
		2 operai * 8 ore * 5 giorni		€/h	80,00	80,00	€ 43,46	€ 3.476,80
2	M00.A40.002	Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm - Operaio specializzato III livello						
		2 operai * 8 ore * 5 giorni		€/h	80,00	80,00	€ 2,58	€ 206,40
3	N00.A25.240	Nolo di autocarro mezzo d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolato, compreso autista e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo - autocarro P.T.T. oltre 18,0 t fino a 24,0 t						
		3 * 8 ore * 10 giorni (Trasporto materiale da disalveo)		€/h	240,00	240,00	€ 88,63	€ 21.271,20
4	N00.E52.060	Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo - potenza oltre 30 kW fino a 42 kW peso operativo da 46 a 75 qli - tipo CAT 306						
		8 ore * 3 giorni (Disalveo)		€/h	24,00	24,00	€ 75,00	€ 1.800,00
5	N00.E53.080	Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo - escavatore cingolato potenza oltre 60 kW fino a 80 kW peso operativo da 151 a 230 qli - tipo CAT 320						
		2 * 8 ore * 10 giorni (Disalveo)		€/h	160,00	160,00	€ 96,36	€ 15.417,60
6	N00.P15.090	Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continua - pala gommata potenza oltre 50 kW fino a 90 kW peso operativo da 61 a 80 qli - tipo CAT 910						
		8 ore * 3 giorni (Disalveo)		€/h	24,00	24,00	€ 73,43	€ 1.762,32
7	T01.D20.010	Fornitura e posa in opera di box bagno - Servizi igienici - noleggio 1° mese						
		nr 1		cad.	1,00	1,00	€ 249,88	€ 249,88

8	T01.D30.010	Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego				
		nr 1	cad.	1,00	1,00 € 480,14 €	480,14
9	SIC	Altri oneri della sicurezza				€ 3.000,00
					TOTALE LORDO	€ 47.664,34
					Oneri della sicurezza NON SOGGETTI a ribasso	€ 3.730,02
					Importo NON SOGGETTO a ribasso per affidamento in somma urgenza	€ 60.000,00
					Importo SOGGETTO a ribasso	€ -
					Ribasso del 11,70%	€ -
					TOTALE NETTO	€ 47.664,34
Quart, li 14.07.2025						
		IL TECNICO			L'IMPRESA	
						

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Intervento urgente ed indifferibile di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica dei torrenti Chantéry e Ergioi del comune di Rhêmes-Notre-Dame, a seguito di due colate detritiche.

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
5	N00.E53.080	Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo - escavatore cingolato potenza oltre 60 kW fino a 80 kW peso operativo da 151 a 230 qli - tipo CAT 320						
		8 ore * 10 giorni (Sistemazione del materiale detritico vallo)		€/h	80,00	80,00	€ 96,36	€ 7.708,80
9	SIC	Altri oneri della sicurezza					€	3.000,00
TOTALE LORDO							€	10.708,80

	Oneri della sicurezza NON SOGGETTI a ribasso	€	3.000,00
	Importo NON SOGGETTO a ribasso per affidamento in somma urgenza	€	60.000,00
	Importo SOGGETTO a ribasso	€	-
	Ribasso del 7,00%	€	-
	TOTALE NETTO	€	10.708,80

Quart, li 14.07.2025

IL TECNICO

L'IMPRESA


Chacard S.r.l.
 Impresa Edile
 Loc. Les Îles, 24/8 - 11020 Pollein (Ao)
 Tel. & Fax 016553419
 E-mail: info@chacardsrl.it C.F. e P.IVA
 PEC: chacardsrl@pec.it 01059440071
