Région Autonome Vallée d'Aoste | Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art.140 del D.lgs 36/2023)

"Intervento di messa in sicurezza idraulica dell'opera di presa irrigua e di ripristino funzionale dei manufatti idraulici danneggiati dall'evento calamitoso del 29/30 giugno 2024 sul Torrente Valleille in Comune di Cogne"

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione n. 304 inerente la dichiarazione dello stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024;

Richiamata la condizione di dissesto idraulico – gravitativa su tutto il bacino idrografico del Torrente Valleille riscontrata durante l'evento alluvionale del 29-30 giugno 2024, con importanti variazioni dell'assetto idraulico del torrente, ulteriormente aggravate e modificate dall'evento meteo breve ed intenso del 5 settembre 2024;

Sulla base delle conseguenti osservazioni raccolte e riscontrate in sito contestualmente alla redazione del presente verbale, da cui si sono evidenziate le seguenti condizioni e criticità:

- L'evento alluvionale del 29/30 giugno 2024 ha determinato sul bacino idrografico del Torrente Valleille importanti processi erosivi, di sovralluvionamento e di deposito lungo tutto il suo corso, particolarmente aggravati dall'interferenza costituita dalle colate detritiche laterali;
- In particolare in corrispondenza dell'opera di presa irrigua, gestita dal CMF Prés de Saint Ours e localizzata sul punto di coordinate UTM (ED50) - X: 374616,35 Y: 5049355,21 a quota 1690 m all'interno dell'alveo del Torrente Valleille, le dinamiche idraulico – gravitative hanno comportato lo sfondamento per almeno 22 m della traversa di derivazione, rendendo inutilizzabili i manufatti idraulici posti in destra idrografica;

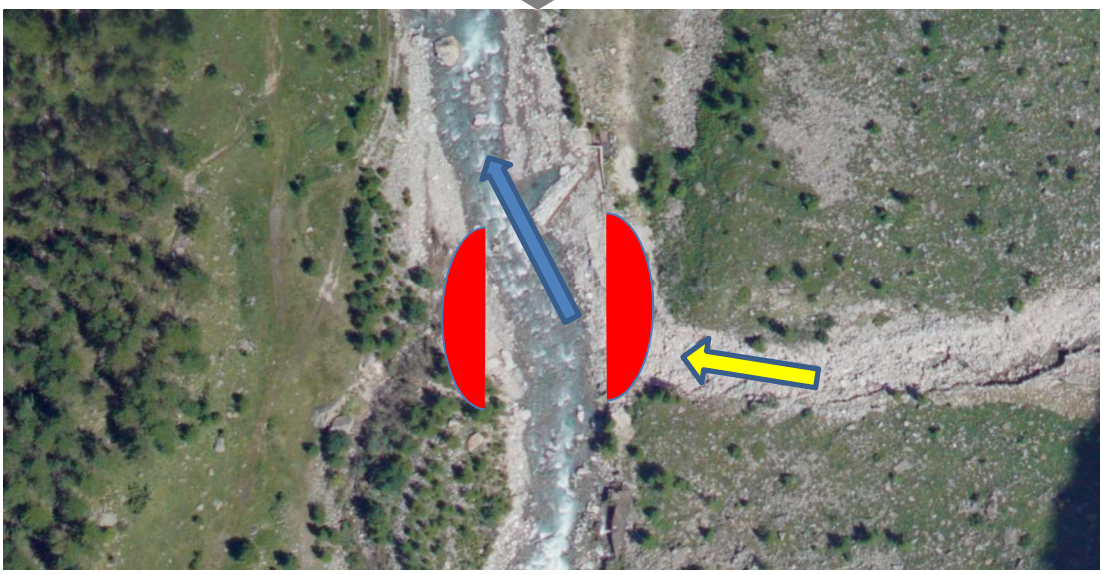

- Le dinamiche idrauliche del Torrente Valleille sul tratto in questione hanno sviluppato importanti processi erosivi spondali in destra e sinistra idrografica, aggravati dall'innesto in destra idrografica di un canalone detritico;
- L'erosione in destra idrografica, oltre che incidere sui manufatti idraulici irrigui, ha determinato una condizione di dissesto anche per le opere di presa dell'acquedotto comunale, poste a monte dell'intersezione Valleille – canalone detritico;
- L'erosione in sinistra idrografica ha intaccato il settore sinistro della traversa di derivazione, creando un direttrice di aggiramento;
- La condizione idraulica dell'alveo del Torrente Valleille impone di agire anche nella messa in opera di difese spondali in sinistra e destra idrografica al fine di garantire la necessaria protezione dei manufatti idraulici;

lo scrivente, Dr. Geol. Massimo Pasqualotto, dirigente della struttura Sistemazioni montane dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, considerando l'urgenza temporale di garantire in tempi brevi l'erogazione idrica ad uso irriguo – zootecnico e per proteggere l'acquedotto comunale in una condizione dinamica ad elevata energia, ritiene la sussistenza di importanti motivi di incolumità per la tutela di persone e beni e contestualmente garantire la continuità delle attività agricole tali da giustificare l'attivazione di un intervento di somma urgenza.

L'intervento dovrà essere finalizzato al ripristino strutturale della traversa di derivazione ed alla protezione spondale dei manufatti idraulici. Ulteriori valutazioni operative verranno svolte a seguito delle prime verifiche ed interventi in sito.

Il sottoscritto, Massimo Pasqualotto, considerando l'urgenza temporale incompatibile con i tempi di affidamento previsti ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, ritiene indispensabile ed indilazionabile intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando la ditta individuata dell'effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti.

I lavori in questione verranno quindi eseguiti ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, ed affidati all'operatore economico Sapia Benedetto Costruzioni srl di Aosta, già presente sul posto per affidi precedenti ed a conoscenza diretta dei luoghi e dei manufatti idraulici preesistenti, in possesso dei requisiti tecnico – professionali (qualificazione OG8) e delle attrezzature necessarie, che si è dichiarato disponibile ad attivarli immediatamente, e consistono in:

- Lavorazioni di disalveo e movimentazione materiale alluvionale in alveo a liberare la zona d'imposta dei manufatti idraulici;
- Ripristino della traversa di derivazione con platea di fondo;
- Realizzazione di circa 70 m di scogliera a grossi blocchi a secco in destra idrografica;
- Realizzazione di circa 45 m di scogliera a grossi blocchi a secco in sinistra idrografica;

- Pulizia e rispristino funzionale dei manufatti idraulici e dei componenti accessori danneggiati.

Si evidenzia l'urgenza di attivare l'intervento in tempi brevi al fine di garantire la conservazione delle potenzialità idraulico – irrigue ed il ripristino dei manufatti di derivazione.

Le funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi del D.lgs.36/2023, sono in carico allo scrivente come dirigente della struttura Sistemazioni montane, il quale attesta l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interesse anche solo potenziali, propri o di propri parenti affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 16 del d.lgs 36/2023.

Le funzioni di Direzione lavori, ai sensi del D.lgs.36/2023, sono state affidate all'Ing. Savoie Marco dello studio Atelier Projet di Saint Christophe, vista l'indisponibilità di usufruire personale tecnico interno con le dovute conoscenze ed esperienze tecniche, che si è dichiarato pronto ad eseguirle immediatamente.

Ai sensi dell'art.140, comma 4 del D.lgs. 36/2023, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori sarà redatta la perizia giustificativa come prevista dalla suddetta normativa.

La Ditta individuata procederà alla predisposizione del proprio POS, anche sulla base delle indicazioni perla sicurezza, con particolare riferimento alle interferenze, formulate dal DL.

Fatto per dovere d'ufficio
Quart, 30/09/2024

IL DIRIGENTE
- Dott. Geol. Massimo PASQUALOTTO –
(documento firmato digitalmente)

MASSIMO
PASQUALOTTO
REGIONE
AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
DIRIGENTE
30.09.2024
15:34:21
GMT+01:00
